



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2020

Señores
Comisión Nacional de Valores
Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión
25 de mayo 175
Ciudad A. de Buenos Aires S. / D.

REF.: HECHO RELEVANTE. Informe auditor Independiente Quinquela + Predial
Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260 "Proyecto Ruiz Huidobro".

Se adjunta al presente informe realizado por auditor independiente acerca del estado de avance del proyecto de referencia.

Carlos Federico Diez
Apoderado

Javier Cadahia
Apoderado

Buenos Aires, 05 de febrero de 2020

**INFORME TÉCNICO N° 03/47.0
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
OBRA RUIZ HUIDOBRO 3055 - CABA**

1.- OBJETO

El presente Informe Técnico tiene por objeto describir el estado de la documentación y de la obra de referencia, a la fecha de la visita efectuada el 22/01/2020.

2.- ALCANCE

La revisión efectuada consistió en el análisis de la siguiente documentación:

- Informe Técnico IT 03.42.1 de fecha 29/10/2019
- Documentación de Empresas de Servicios (**Anexo 3**)
- Certificados de obra de Contratista (**Anexo 4**)
- Documentación cumplimiento de Leyes (**Anexo 5**)
- Informe del Desarrollador de fecha 01/2020 (**Anexo 6**)

Se adjunta, en **Anexo 2**, una Lista de Chequeo de Documentación identificando los documentos analizados y las observaciones relevantes correspondientes.

La revisión se complementó con una visita realizada al inmueble en cuestión el día 22/01/2020, en la que fui atendidos por el Sr. **Gastón Catelani** de Induplack SA.

3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA

En el Informe Técnico IT 03.42.1 de fecha 29/10/2019, se dejó constancia de la existencia y verificación de los siguientes documentos:

- Cómputos Métricos
- Planilla de Unidades y Superficies
- Estudio de Suelos
- Factibilidades de Servicios:
 - **Edenor y Metrogas** - las factibilidades están vencidas (05/04/2018 y 31/03/2019 respectivamente). El Desarrollador no ha informado si está gestionando su renovación.
- Relevamiento de linderos
- Planos de Demolición y de Obra Nueva Registrados

En materia de factibilidades de servicios, se nos envió copia de la aprobación de la factibilidad emitida por la empresa **AySA**, con vencimiento el 16/08/2020.

4.- PLANOS MUNICIPALES

El proyecto cuenta con la totalidad de planos registrados.

5.- PERMISOS DE OBRA

Con el registro de planos queda habilitado el inicio de la obra de construcción nueva.

6.- INICIO DE OBRA

La obra está iniciada y en la fase de ejecución de estructura de hormigón de elevación.,

7.- ESTADO DE LA OBRA

7.1 Avance de Obras

En la visita se relevaron los siguientes avances:

- **Estructura** – se completó la totalidad de la estructura
- **Albañilería** – se levantaron tabiques exteriores hasta el piso 4° e interiores sólo hasta el piso 3°. No se amuraron marcos de puertas.
- **Contrapisos y Carpetas** – se comenzó a preparar bulines para las fajas de contrapiso en niveles 1° a 3°, en forma parcial
- **Carpinterías** – se colocaron premarcos en forma parcial en niveles 1° a 3°, si bien están todos los premarcos en obra y distribuidos en los pisos

En el cuadro siguiente, se informa el estado de avance de obra según el programa del Plan de Avance de Obra al 12/2019, presentado por el Desarrollador con fecha 26/11/2019, el avance declarado por el mismo en su informe y lo verificado por el suscripto:

#	RUBRO	ESTADO DE AVANCE			Observaciones
		PREVISTO	seg/Informe	EFFECTIVO	
1	TRAMITES MUNICIPALES	100%	100%	100%	
2	DEMOLICIÓN	100%	100%	100%	
3	TAREAS PRELIMINARES	100%	100%	100%	
4	MOVIMIENTO DE SUELOS	100%	100%	100%	
5	HORMIGÓN ARMADO	100%	100%	100%	
6	MAMPOSTERÍAS	60%	51%	55%	medido sobre valores certificado contratista
7	CONTRAPISOS Y CARPETAS	30%	10%	5%	avance bulines en pisos 1° a 3°
8	REVOQUES	0%	0%	0%	
9	REVESTIMIENTOS	0%	0%	0%	
10	VARIOS	15%	8%	8%	asumimos como correcto
11	CARPINTERÍAS PVC Y HERRERÍAS	0%	0%	5%	avance colocación parcial premarcos
12	CONSTRUCCIÓN EN SECO	0%	0%	0%	
13	CARPINTERÍAS DE MADERA	0%	0%	0%	
14	MARMOLERÍA	0%	0%	0%	
15	PINTURA	0%	0%	0%	
16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	30%	19%	19%	asumimos como correcto
17	INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS	0%	0%	0%	
18	AIRE ACONDICIONADO	0%	0%	0%	
19	ASCENSORES	0%	0%	0%	
		34,28%	31,46%	31,70%	

De este cuadro se desprende que la obra está algo atrasada, en especial en los siguientes rubros:

- Mamposterías – avance programado 60%, avance efectivo 55%
- Contrapisos y carpetas - avance programado 30%, avance efectivo 5%
- Inst. Eléctrica - avance programado 30%, avance efectivo 19%

El avance teórico según programa es del **34.28%** en tanto que el avance efectivo relevado es del orden del **31.70%**.

Se nos informó que, durante el mes de diciembre, se cambió de Contratista, pasando la obra gruesa de la firma **Tritone SA** a la firma **Norbau SA**. Es altamente probable que este cambio de contratista haya impactado sobre el ritmo de la obra.

El plantel obrero es de 8 personas.

7.2.- Planos Ejecutivos

No tengo novedad alguna sobre este tema.

7.3.- Certificados de Contratistas

Se me envió copia del Certificado de Obra N° 19 de Hormigón y N° 4 de Albañilería, ambos de la firma **Tritone SA** (**Anexo 4**). Los avances indicados en los mismos se condicen con lo que se releva en la obra.

Recordamos que este Contratista fue reemplazado.

7.4.- Documentación Cumplimiento de Leyes

Se me envió copia del F931 y de su VEP de pago de la contratista **Norbau SA** correspondientes al mes de noviembre de 2019, así como el Certificado de Cobertura de la ART (**Anexo 5**).

7.5.- Aspecto General de la Obra (ver fotos en Anexo 1)

Se puede afirmar que la obra está un tanto atrasada respecto de lo programado, pero este atraso puede ser fácilmente recuperado de mantenerse un adecuado flujo de materiales y los planteles obreros estables.

7.6.- Informes del Desarrollador

Se me envió copia del informe del Desarrollador a **01/2020** (**Anexo 6**), en el que se consignan los siguientes avances por rubro:

- Proyecto, Trámites Municipales, Demolición, Preliminares, Movimiento de Suelo, Hormigón Armado – 100%.
- Mamposterías – 51%, mi estimación es del orden de 55%.
- Contrapisos y Carpetas – 10%, mi estimación es del orden de 5%.
-

El Desarrollador declara un avance global de 31.46% en tanto que mi propia estimación es del 31.70%.

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra está ligeramente atrasada respecto de la programación pero la magnitud de este atraso no es tan importante que impida una recuperación del mismo, en la medida que se mantenga el plantel obrero y se asegure la fluidez de abastecimiento de materiales.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida,



Alberto H. Domínguez Pousada
Arquitecto

Adjuntos:

- Anexo 1** – Fotografías de Obra
- Anexo 2** – Lista de chequeo de documentación
- Anexo 3** – Documentación de Empresas de Servicios
- Anexo 4** – Certificados del Contratista
- Anexo 5** – Documentación de Cumplimiento de Leyes
- Anexo 6** - Informe del Desarrollador

ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE OBRA




VISTA DE LA OBRA DESDE EL OESTE



VISTA DE LA OBRA DESDE EL ESTE



BULINES PARA CONTRAPISO

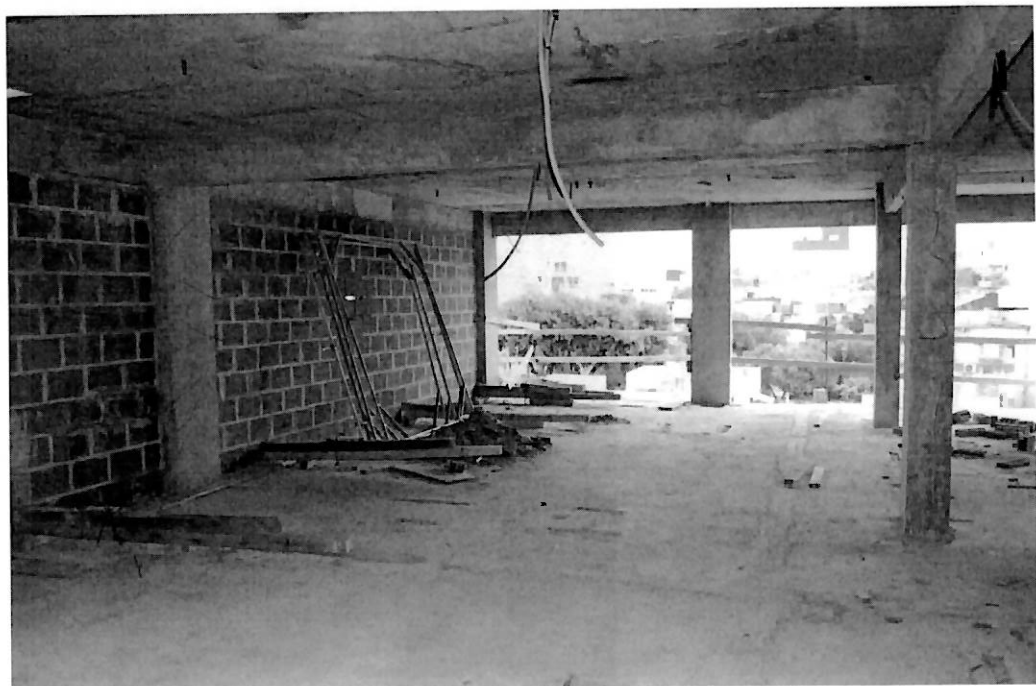

VISTA PISO 4° - FALTAN TABIQUES INTERIORES

ANEXO 2 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN

OBRA: RUIZ HUIDOBRO 3055

FECHA: 22/01/2020

#	DESIGNACIÓN	SI	NO	Observaciones
1	DOCUMENTACIÓN PREVIA			
1.1	CÓMPUTO MÉTRICO			Informe DP&A #159/0.1
1.2	PROGRAMA DE OBRA			Recibida actualización
1.3	PLANILLA DE UNIDADES Y SUPERFICIES			Informe DP&A #159/0.1
1.4	ESTUDIO DE SUELO			AGH 11/2016
1.5	FACTIBILIDADES			
1.5.1	Energía Eléctrica			Edenor - vencida 05/04/2018
1.5.2	Gas			Metrogas - vencida el 31/03/2019
1.5.3	Agua y Cloaca			AySA - factibilidad vence 16/08/2020
1.6	RELEVAMIENTO MEDIANERAS			Actuación notarial 30/09/2016
2	PLANOS MUNICIPALES			
2.1	ARQUITECTURA			Registrado Exp #15021983-17
2.2	CONDICIONES CONTRA INCENDIO			Registrado Exp #15021983-17
2.3	ESTRUCTURA			Registrado Exp #15021983-17
2.4	INST. ELÉCTRICA			Registrado Exp #15021983-17
2.5	INST. SANITARIA			Registrado Exp #15021983-17
2.6	INST. VENTILACIONES MECÁNICAS			Registrado Exp #2106212-17
2.7	ASCENSORES			Registrado Exp #15021983-17 (15/05/2018)
3	PERMISO DE OBRA			
3.1	LIQUIDACIÓN DE DERECHOS			
3.1.1	Derechos de Construcción			Pagado 12/07/2017
3.1.2	Derecho de Registro de Planos			Asumimos que están pagos al estar los planos registrados
3.1.3	Impuesto a la Generación de Aridos			Pagado 12/04/2017
4	INICIO DE OBRA			
4.1	DEMOLICIÓN			
4.1.1	Plano de Demolición			Registrado Exp #15021983/17 de fecha 10/10/2017
4.1.2	Solicitud Inspección Ley 4268			Informe AVO Demolición Final de fecha 31/01/2018
4.2	EXCAVACIÓN			
4.2.1	Solicitud Inspección Ley 4268			Informe AVO al 50% de fecha 25/01/2019
5	DOCUMENTACIÓN OBRA			
5.1	PLANOS EJECUTIVOS			
5.2	CERTIFICADOS DE AVANCE			
	Preliminares + Movimiento de Suelo + Hormigón			Certificado #19 - Tritone SA (al 04/12/2019)
	Albañilería + Construcción en seco + Pintura			Certificado #4 - Tritone SA (al 10/12/2019)
5.3	INFORMES DEL DESARROLLADOR			Emitido 01/2020
6	DOCUMENTACIÓN LEGAL			
6.1	AFIP 931			F931 de Norbau SA correspondiente a 11/2019
6.2	LISTADOS ART			Cobertura Prevención ART de fecha 13/01/2020

ANEXO 3
DOCUMENTACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO



NOTA N° 366630 /19

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de agosto de 2.019

Señores:

"Induplack Fiduciaria S.A."

La Carra N° 3.472

(C. P. N° 1.712) - CASTELAR - Pcia. de Buenos Aires.

Factibilidad de servicios para la obra por construirse en la calle Avda. Ruiz Huidobro N° 3.055. C.A.B.A.-

Fecha de Solicitud: 30/07/2.019. Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica.

Estimados Señores:

Nos dirigimos a Uds. para dar respuesta a la nota de referencia por la que nos solicita la factibilidad de la provisión de los servicios de agua y de cloaca para la obra por construirse en la calle Avda. Ruiz Huidobro N° 3.055, C.A.B.A., que contará con 34 Unidades funcionales, una superficie cubierta total de 1714,86 m², y una reserva total domiciliaria de 21 m³, según información suministrada mediante "Nota de Solicitud de Servicios" Ingresada a nuestra Empresa con fecha 30/07/2.019.

Al respecto, les informamos que no existen inconvenientes de orden técnico para otorgarles la factibilidad de agua y de cloaca en las condiciones declaradas en la Nota de referencia sobre las redes de servicios emplazadas en la calle frentista, a abastecerse con:

- ✓ 1 conexión de agua Ø 25 mm.
- ✓ 1 conexión de cloaca Ø 110 mm.

Cabe agregar que de contar con conexiones de agua y de cloaca existentes en servicio, éstas serán anuladas en el momento en que se ejecuten las nuevas conexiones, dejando en funcionamiento sólo las aprobadas en la presente nota.

La factibilidad que se les otorga por la presente, reemplaza al Certificado emitido por Nota N° 334.841/18 y tendrá una validez de 12 meses a contar del día de la fecha, sin eximir de la realización del trámite de solicitud de conexión, el cual deberá llevarse a cabo en nuestros Centros de Atención al Usuario.

Los saludamos atentamente.

SISEME N° 337.371.
Distrito BELGRANO.-


 **Arq. FEDERICO ZAMBRA**
Director
Dirección Regional Capital Federal

Para Atención Comercial

 **6333-AGUA(2482)**

Lunes a viernes de 9 a 16 horas

Para Atención Técnica

 **0800-321-AGUA(2482)**

Todos los días, las 24 horas

ERAS:0800-333-0200

Lunes a viernes de 9 a 17 horas

Ud. podrá realizar los reclamos u otros trámites comerciales en nuestros Centros de Atención, en nuestra página Web: www.aysa.com.ar, o vía e-mail a atencionalusuario@aysa.com.ar, o en los teléfonos mencionados.

ANEXO 4

CERTIFICADOS DEL CONTRATISTA

10 DE NOVIEMBRE DE 2019											
4 DE DICIEMBRE DE 2019											
ITEM	RUBRO	DETALLE			TOTAL	Certificado Anterior Acum. (%)	Certificado ACTUAL (%)	Certificado TOTAL Acumulado	Certificado Anterior Acum. (\$)	Certificado ACTUAL (\$)	Certificado TOTAL Acumulado
1	TAREAS PRELIMINARES										
1.1	Sereno	mes	8,00	\$ 23.702,13	\$ 189.617,04	80,00	20,00	100,00	151.693,63	37.923,41	189.617,04
1.2	Replanteo	gl	1,00	\$ 121.439,90	\$ 121.439,90	80,00	20,00	100,00	97.151,92	24.287,98	121.439,90
1.3	Capataz	mes	8,00	\$ 29.627,67	\$ 237.021,36	80,00	20,00	100,00	189.617,09	47.404,27	237.021,36
1.4	Seguridad e Higiene: Fijo durante excavaciones, Programa, Visit	gl	1,00	\$ 24.683,93	\$ 24.683,93	80,00	20,00	100,00	19.747,14	4.936,79	24.683,93
2	MOVIMIENTO DE SUELOS										
2.1	Excavación de bases	m3	803,69	\$ 691,83	\$ 556.015,12	100,00		100,00	556.015,12	0,00	556.015,12
3	HORMIGON ARMADO										
3.1	Submuraciones	m3	66,36	\$ 11.020,00	\$ 731.287,20	100,00		100,00	731.287,20	0,00	731.287,20
3.2	Bases aisladas	m3	79,37	\$ 3.033,31	\$ 240.738,65	100,00		100,00	240.738,65	0,00	240.738,65
3.3	Zapatas corridas	m3	8,31	\$ 8.261,30	\$ 68.620,42	100,00		100,00	68.620,42	0,00	68.620,42
3.4	Tensoros	m3	31,75	\$ 9.260,51	\$ 293.984,15	100,00		100,00	293.984,15	0,00	293.984,15
3.5	Losa s/ SS	m2	155,05	\$ 1.296,34	\$ 200.997,52	100,00		100,00	200.997,52	0,00	200.997,52
3.6	Losa s/ Planta baja	m2	247,83	\$ 1.296,34	\$ 321.271,94	100,00		100,00	321.271,94	0,00	321.271,94
3.7	Losa s/ 1° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20	100,00		100,00	308.075,20	0,00	308.075,20
3.8	Losa s/ 2° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20	100,00		100,00	308.075,20	0,00	308.075,20
3.9	Losa s/ 3° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20	100,00		100,00	308.075,20	0,00	308.075,20
3.10	Losa s/ 4°Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20	100,00		100,00	308.075,20	0,00	308.075,20
3.11	Losa s/ 5° Piso	m2	231,11	\$ 1.296,34	\$ 299.597,14	100,00		100,00	299.597,14	0,00	299.597,14
3.12	Losa s/ 6° Piso	m2	209,40	\$ 1.296,34	\$ 271.453,60	100,00		100,00	271.453,60	0,00	271.453,60
3.13	Losa s/ 7° Piso	m2	143,16	\$ 1.296,34	\$ 185.584,03	50,00	50,00	100,00	92.792,02	92.792,02	185.584,03
3.14	Losa s/ 8° Sala de Maquinas	m2	38,98	\$ 1.296,34	\$ 50.531,33	0,00	100,00	100,00	0,00	50.531,33	50.531,33
4	VARIOS										
4.1	Armado de defensas perimetrales	un	2,00	\$ 77.223,44	\$ 154.446,88	80,00	20,00	100,00	123.557,50	30.889,38	154.446,88
4.2	Limpieza general de obra	gl	1,00	\$ 20.408,98	\$ 20.408,98	80,00	20,00	100,00	16.327,18	4.081,80	20.408,98

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO		\$	292.846,97
DEVOLUCION ANTICIPO	0,15000	\$	43.927,05
FONDO DE REPARO	0,05000	\$	14.642,35
SUBTOTAL		\$	234.277,57
AJUSTE CAC BASE JULIO 2018	0,63300	\$	148.297,70
TOTAL		\$	382.575,28

El presente certificado no incluye el impuesto al valor agregado del 10,5 %

DESDE		10 DE NOVIEMBRE DE 2019								
HASTA		10 DE DICIEMBRE DE 2019								
ITEM	RUBRO	DETALLE	TOTAL	Certificado Anterior Acum. (%)	Certificado ACTUAL (%)	Certificado TOTAL Acumulado (%)	Certificado Anterior Acum. (\$)	Certificado ACTUAL (\$)	Certificado TOTAL Acumulado (\$)	
1 TAREAS PRELIMINARES										
1.1	Obrador y Baño de obra	gl 1,00	\$ 145.308,51	\$ 145.308,51	100,00	100,00	145.308,51	0,00	145.308,51	
1.2	Armado de guinche y andamios	gl 1,00	\$ 215.434,39	\$ 215.434,39	100,00	100,00	215.434,39	0,00	215.434,39	
1.3	Replanteo general de obra	gl 1,00	\$ 13.464,66	\$ 13.464,66	10,00	10,00	1.346,46	0,00	1.346,46	
1.4	Jefe de Obra	gl 1,00	\$ 177.733,37	\$ 177.733,37	10,00	10,00	17.773,34	0,00	17.773,34	
1.5	Camioneta. Ta. Oficina	gl 1,00	\$ 129.260,64	\$ 129.260,64	10,00	10,00	12.926,06	0,00	12.926,06	
1.6	Capataz	gl 1,00	\$ 377.010,19	\$ 377.010,19	10,00	10,00	37.701,02	0,00	37.701,02	
1.7	Administrativo	gl 1,00	\$ 159.421,45	\$ 159.421,45	10,00	10,00	15.942,15	0,00	15.942,15	
1.8	Sereno	gl 1,00	\$ 150.804,07	\$ 150.804,07	10,00	10,00	15.080,41	0,00	15.080,41	
1.9	Legajo de SeH	gl 1,00	\$ 10.738,17	\$ 10.738,17	100,00	100,00	10.738,17	0,00	10.738,17	
1.10	Ingeniero en SeH	gl 1,00	\$ 75.402,04	\$ 75.402,04	10,00	10,00	7.540,20	0,00	7.540,20	
2 MAMPOSTERIAS										
2.1	Elevación ladrillo hueco 12x15x33 (palleros y divisores de un	m2 752,00	\$ 454,20	\$ 341.556,94	35,00	20,00	55,00	119.544,93	68.311,39	187.856,32
2.2	Elevación ladrillo hueco 12x15x33 (SS, PB, frente, contrafre	m2 486,15	\$ 454,20	\$ 220.808,39	35,00	20,00	55,00	77.282,94	44.161,68	121.444,61
2.3	Elevación ladrillo común 11x22x5,5 (medianeras y patios)	m2 1092,89	\$ 604,08	\$ 660.196,74	35,00	20,00	55,00	231.068,86	132.039,35	363.108,20
2.4	Rampa y escalera de acceso al edificio	gl 1,00	\$ 93.649,52	\$ 93.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CONTRAPISOS Y CARPETAS										
3.1	Contrapiso sobre terreno natural sector hall y local PB	m2 72,46	\$ 330,94	\$ 23.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Contrapiso con pendiente en balcones	m2 64,44	\$ 403,32	\$ 25.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Contrapiso con pendiente en terrazas	m2 196,72	\$ 403,32	\$ 79.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Contrapiso de cascotes en veredas	m2 25,95	\$ 229,27	\$ 5.949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Contrapiso de cascotes sobre losas e: 5cm	m2 1141,45	\$ 117,05	\$ 133.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Contrapiso en PB sector descubierta	m2 130,70	\$ 403,32	\$ 52.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Carpetas interiores e: 3cm	m2 1141,45	\$ 131,13	\$ 149.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Carpetas de protección de membrana	m2 261,16	\$ 182,16	\$ 47.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Carpetas rodillada en escaleras	un 8,00	\$ 5.158,22	\$ 41.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Banquinas bajo mesadas	ml 106,99	\$ 358,20	\$ 38.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 REVOQUES										
4.1	Revoque grueso y fino en palleros y escaleras	m2 760,66	\$ 238,79	\$ 181.639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Revoque grueso y fino en PB	m2 228,00	\$ 238,79	\$ 54.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Revoque bajo revestimiento en baños y cocinas	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Picado y azotado hidrófugo en medianeras existentes	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Revoque grueso en medianeras existentes en PB	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Azotado hidrófugo y revoque grueso en medianeras PB sect	m2 225,12	\$ 238,79	\$ 53.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Revoque exterior 3 en 1 (incluye Enchapado + Aristas + Buñ	m2 1392,08	\$ 446,71	\$ 621.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Revoque proyectado de yeso en paredes y cielorrasos	m2 2950,50	\$ 344,24	\$ 1.015.667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 REVESTIMIENTOS										
5.1	Piso de baldosón granítico en vereda	m2 25,95	\$ 286,56	\$ 7.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Piso de cerámico en baños sector local	m2 121,50	\$ 382,11	\$ 46.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Pared de cerámico en baños con listello sector local	m2 930,96	\$ 520,50	\$ 484.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Piso de porcelanato en locales	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Piso de cerámico en baños	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Pared de cerámico en baños con listello	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Piso de porcelanato en unidades	m2 908,62	\$ 382,11	\$ 347.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Piso de porcelanato en balcones	m2 64,44	\$ 382,11	\$ 24.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Piso de porcelanato en palleros	m2 111,13	\$ 382,11	\$ 42.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Zócalo de porcelanato en palleros	ml 201,11	\$ 178,52	\$ 35.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Piso de porcelanato en hall PB	m2 75,38	\$ 382,11	\$ 28.803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Pared de cerámico en cocinas	m2 145,11	\$ 382,11	\$ 55.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Piso de cerámico exterior en terrazas	m2 196,72	\$ 382,11	\$ 75.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 VARIOS										
6.1	Colocación membrana asfáltica 4mm en terraza	m2 261,16	\$ 429,85	\$ 112.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Colocación de premarcos <2m2	un 5,00	\$ 2.101,04	\$ 10.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Colocación de premarcos >2m2	un 50,00	\$ 2.101,04	\$ 105.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Colocación de puertas	un 46,00	\$ 1.270,53	\$ 58.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Colocación de bañeras 150x70	un 31,00	\$ 1.194,02	\$ 37.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	Colocación de rejillas de ventilación cocinas	un 62,00	\$ 117,05	\$ 7.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Babetas en azoteas	ml 67,99	\$ 429,85	\$ 29.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	Empolvamiento de hormigón en escaleras	un 8,00	\$ 6.591,81	\$ 52.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	Picado de vereda existente	m2 25,95	\$ 566,42	\$ 14.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	Colocación de Gardenblock	m2 0,00		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	Armado de defensas	un 3,00	\$ 101.715,95	\$ 305.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	Limpieza general de obra	gl 1,00	\$ 217.962,76	\$ 217.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 CONSTRUCCION EN SECO										
7.1	Tabiques (Estructura + Emplacado + Masillado + Colocación	m2 679,04	\$ 330,33	\$ 224.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cielorrasos interiores (Estructura + Emplacado + Masillado)	m2 621,99	\$ 322,62	\$ 199.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Cielorrasos de balcones (Estructura + Colocación de tablas	m2 64,44	\$ 322,62	\$ 20.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Frente de cajón (incluye aristas)	ml 306,98	\$ 280,93	\$ 86.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Cajón con cantonera (incluye aristas)	ml 314,60	\$ 280,93	\$ 88.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 PINTURA EXTERIOR										
8.1	Revestimiento exterior en medianeras y patios incluye 1a m	m2 1256,82	\$ 548,45	\$ 689.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Revestimiento exterior tipo tarquin en frente, contrafrente y	m2 473,40	\$ 548,45	\$ 259.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PINTURA INTERIOR										
9.1	Colocación de antióxido en barandas exteriores	un 24,00	\$ 587,86	\$ 14.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Pintura al látex en espacios comunes, baños y cocinas sect	m2		\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Esmalte sintético en marcos interiores	un 46,00	\$ 1.002,81	\$ 46.129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Esmalte sintético en barandas exteriores e interiores	un 32,00	\$ 691,58	\$ 22.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades monocabi	un 23,00	\$ 49.908,33	\$ 1.147.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de unidades	un 23,00	\$ 16.472,18	\$ 378.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades dos amb	un 8,00	\$ 59.889,99	\$ 479.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de unidades	un 8,00	\$ 19.763,70	\$ 158.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades tres amb	un 2,00	\$ 68.873,49	\$ 137.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de unidades	un 2,00	\$ 22.728,26	\$ 45.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Pintura tipo Loxon en caja de escaleras	un 8,00	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12	Pintura al látex en palleros	un 8,00	\$ 10.171,85	\$ 81.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.13	Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de palleros	un 8,00	\$ 7.840,63	\$ 62.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14	Pintura tipo Loxon en sala de máquinas y azoteas	gl 1,00	\$ 165.497,19	\$ 165.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15	Enduido y Pintura al látex en paredes hall PB	un 1,00	\$ 131.813,27	\$ 131.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.16	Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de hall PB	un 1,00	\$ 91.443,27	\$ 91.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.17										



4 DE DICIEMBRE DE 2019										Certificado	Certificado	Certificado	Certificado	Certificado	Certificado	Certificado	Certificado	Certificado	Certificado
RUBRO										Anterior Acum. (%)	ACTUAL (%)	TOTAL Acumulado	Anterior Acum. (\$)	ACTUAL (\$)	TOTAL Acumulado	Anterior Acum. (\$)	ACTUAL (\$)	TOTAL Acumulado	Anterior Acum. (\$)
TAREAS PRELIMINARES										100,00		100,00	189.617,04	0,00	100,00	189.617,04	0,00	100,00	189.617,04
Sereno	mes	8,00	\$ 23.702,13	\$ 189.617,04						100,00		100,00	189.617,04	0,00	100,00	189.617,04	0,00	100,00	189.617,04
Replanteo	gl	1,00	\$ 121.439,90	\$ 121.439,90						100,00		100,00	121.439,90	0,00	100,00	121.439,90	0,00	100,00	121.439,90
Capataz	mes	8,00	\$ 29.627,67	\$ 237.021,36						100,00		100,00	237.021,36	0,00	100,00	237.021,36	0,00	100,00	237.021,36
Seguridad e Higiene: Fijo durante excavaciones, Programa, Visit	gl	1,00	\$ 24.683,93	\$ 24.683,93						100,00		100,00	24.683,93	0,00	100,00	24.683,93	0,00	100,00	24.683,93
MOVIMIENTO DE SUELOS										100,00		100,00	556.015,12	0,00	100,00	556.015,12	0,00	100,00	556.015,12
Excavación de bases	m3	803,69	\$ 691,83	\$ 556.015,12						100,00		100,00	556.015,12	0,00	100,00	556.015,12	0,00	100,00	556.015,12
HORMIGON ARMADO										100,00		100,00	731.287,20	0,00	100,00	731.287,20	0,00	100,00	731.287,20
Submuraciones	m3	66,36	\$ 11.020,00	\$ 731.287,20						100,00		100,00	731.287,20	0,00	100,00	731.287,20	0,00	100,00	731.287,20
Bases aisladas	m3	79,37	\$ 3.033,31	\$ 240.738,65						100,00		100,00	240.738,65	0,00	100,00	240.738,65	0,00	100,00	240.738,65
Zapatillas corridas	m3	8,31	\$ 8.261,30	\$ 68.620,42						100,00		100,00	68.620,42	0,00	100,00	68.620,42	0,00	100,00	68.620,42
Tensores	m3	31,75	\$ 9.260,51	\$ 293.984,15						100,00		100,00	293.984,15	0,00	100,00	293.984,15	0,00	100,00	293.984,15
Losa s/ SS	m2	155,05	\$ 1.296,34	\$ 200.997,52						100,00		100,00	200.997,52	0,00	100,00	200.997,52	0,00	100,00	200.997,52
Losa s/ Planta baja	m2	247,83	\$ 1.296,34	\$ 321.271,94						100,00		100,00	321.271,94	0,00	100,00	321.271,94	0,00	100,00	321.271,94
Losa s/ 1° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20						100,00		100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20
Losa s/ 2° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20						100,00		100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20
Losa s/ 3° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20						100,00		100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20
Losa s/ 4° Piso	m2	237,65	\$ 1.296,34	\$ 308.075,20						100,00		100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20	0,00	100,00	308.075,20
Losa s/ 5° Piso	m2	231,11	\$ 1.296,34	\$ 299.597,14						100,00		100,00	299.597,14	0,00	100,00	299.597,14	0,00	100,00	299.597,14
Losa s/ 6° Piso	m2	209,40	\$ 1.296,34	\$ 271.453,60						100,00		100,00	271.453,60	0,00	100,00	271.453,60	0,00	100,00	271.453,60
Losa s/ 7° Piso	m2	143,16	\$ 1.296,34	\$ 185.584,03						100,00		100,00	185.584,03	0,00	100,00	185.584,03	0,00	100,00	185.584,03
Losa s/ 8° Sala de Maquinas	m2	38,98	\$ 1.296,34	\$ 50.531,33						100,00		100,00	50.531,33	0,00	100,00	50.531,33	0,00	100,00	50.531,33
VARIOS										100,00		100,00	154.446,88	0,00	100,00	154.446,88	0,00	100,00	154.446,88
Armado de defensas perimetrales	un	2,00	\$ 77.223,44	\$ 154.446,88						100,00		100,00	154.446,88	0,00	100,00	154.446,88	0,00	100,00	154.446,88
Limpieza general de obra	gl	1,00	\$ 20.408,98	\$ 20.408,98						100,00		100,00	20.408,98	0,00	100,00	20.408,98	0,00	100,00	20.408,98

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO		\$	5.200.000,00
FONDO DE REPARO		\$	260.000,00
AJUSTE CAC BASE MARZO 20		\$	164.580,00
TOTAL		\$	424.580,00

El presente certificado no incluye el impuesto al valor agregado del 10,5 %

ANEXO 5

DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO LEYES

 931 Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.	Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.	C.U.I.T. 33-71562251-9 Mes - Año 11.2019 Orig. (0) - Rect. (1-9): 0 Servicios Eventuales: No
		Empleados en nómina: 60 Suma de Rem. 1: 144.305,14 Suma de Rem. 2: 144.305,14 Suma de Rem. 3: 144.305,14 Suma de Rem. 4: 171.000,81 Suma de Rem. 5: 144.305,14 Suma de Rem. 6: 0,00 Suma de Rem. 7: 0,00 Suma de Rem. 8: 171.000,81 Suma de Rem. 9: 144.305,14 Suma de Rem. 10: 0,00
Apellido y Nombre o Razón Social: NORBAU S.A.		Nro. Verificador: 924992
Domicilio Fiscal: LEANDRO N ALEM 474 1 A SAN ISIDRO		
V 4100		
I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		
a1 - Total de aportes 20.593,26 a2 - Aportes a favor 0,00 a3 - Aportes S.S. a pagar 20.593,26 b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 26.976,06 b2 - Asignaciones compensadas 0,00 b3 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 Subtotal contribuciones S.S. Retenciones 26.976,06 Contribuciones S.S. a pagar 26.976,06		
II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES a1 - Total de aportes 4.365,30 a2 - Aportes a favor 0,00 a3 - Aportes O.S. a pagar 4.365,30 b1 - Total de contribuciones 8.730,69 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 Subtotal contribuciones O.S. Retenciones 8.730,69 Contribuciones O.S. a pagar 8.730,69		
III - RETENCIONES Saldo retenciones período anterior 0,00 Retenciones del período 0,00 Total retenciones 0,00 Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00 Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 Saldo de retenciones a período futuro 0,00		
IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS Monto base de cálculo 0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00 Percepciones de Vales Aliment. 0,00		
V - RENATRE Total Contribuciones RENATRE 0,00 Total Seg. Sepelio UATRE 0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO Cantidad de CUILES con ART 60 36,00 Remun. con ART 144.305,14 16.017,87 L.R.T. total a pagar 16.053,87		
VII - SEGURO DE VIDA Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 59 - 831,31 Costo Emisión: 0,00 S.C.V.O. a Pagar: 831,31		
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00 Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00		
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN		
351 - Contribuciones de Seguridad Social 26.976,06 301 - Aportes de Seguridad Social 20.593,26 360 - Contribuciones RENATRE 0,00 352 - Contribuciones de Obra Social 8.730,69 935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00 Forma de Pago: Efectivo		
302 - Aportes de Obra Social 4.365,30 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00 312 - L.R.T. 16.053,87 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 831,31		



Detalle de Salientud de Pago de Servicios

Nro. de Salientud: 2954033

Nombre de Empresa/Servicio: AFIP - AFIP Pago de VEP

CUIT de Empresa/Servicio: 33-69345023-9

Número de Cuenta: 3371362251914906117

Descripción:

Método de Pago: Pago por Internet

Cuenta de Débito: CC en Pesos 086-0185949

Factura: 0006438470821911000

Importe de Deuda: \$ 77.550,49

Monto a Pagar: \$ 77.550,49

Fecha de Vencimiento: **/**/****

Estado: Aceptada

Fecha y Hora de Estado: 13/12/2019 11:39CE

Remisor: SIMONETTA JUAN CARLOS



Volante Electrónico de Pago

El presente VEP está pendiente de pago y expira en 15 días.

Nro. VEP: 3371362251914906117

Organismo Receptor: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores 3 0035 - Barelo DJ

Descripción de Deuda: SUPDUT 1179

CUIT: 33-713622514

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2013-11

Código de control de presentación de DJ nro: 009348425

Generador de Usura: 20149551179

Fecha Generación: 2019-12-10 Hora: 17:18:23

Vigencia: 2020-01-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (35%)	\$ 26.976,09
EMP. ZADOR APORTES SEG. SOCIAL (30%)	\$ 23.583,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (25%)	\$ 19.387,85
APORTES OBRAS SOCIALES (30%)	\$ 4.983,80
AGRO. RESQUÉ DE PRABALO L. 21857 (312)	\$ 18.052,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (281)	\$ 631,31
Importe total a pagar	\$ 77.550,49

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://www.afip.gub.uy/vep>

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN



PREVENCIÓN Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., autorizada a afiliar en todo el país con los alcances establecidos en la ley de riesgos del trabajo 24.557 por Resolución Nº 24404/96 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Resolución Nº 103/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, certifica que el empleador NORBAU S.A. C.U.I.T. 33-71562251-9 con domicilio en L N ALEM 474 - PISO 1 - DEPTO. A tiene emitido un Contrato de Afiliación registrado bajo el número 625862 en los términos de la ley 24.557 sus decretos y leyes complementarias y reglamentarias, cuya vigencia se extiende entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020 amparando su personal en relación de dependencia, cuya nómina se detalla abajo.

En el supuesto que se efectuen trabajos en altura, el presente certificado ampara la realización de los mismos por parte de los trabajadores dependientes del empleador NORBAU S.A.

El presente certificado se extiende a pedido del afiliado en Sunchales (SF) el día 13 de enero de 2020 para ser presentado ante quien corresponda, y por el término de 30 días, careciendo de todo valor una vez operado el vencimiento del plazo indicado.

DETALLE DEL PERSONAL AMPARADO AL 13/01/2020

Empresa: NORBAU S.A.. Contrato: 625862

C.U.I.T./Documento	APELLIDO Y NOMBRE	CONDICIÓN
20936972722		Régimen General
20957649654		Régimen General
20947617436	ACOSTA ADORNO ABDON CENEN	Régimen General
20948241243	ACOSTA IRALA MILCIADES	Régimen General
20946832384	AQUINO ANTONIO MANUEL	Régimen General
20433230354	ARROYO JORGE ALEJANDRO	Régimen General
20422244604	ARROYO LUIS ENRIQUE	Régimen General
20952223713	AYALA ARMOA CRISTIAN ARIEL	Régimen General
20957321489	AYALA ARMOA HERNAN	Régimen General
20949619002	AYALA LEDEZMA CESAR	Régimen General
20129105403	BARBERO FRANCISCO PABLO	Régimen General
20134077418	BARBERO RICARDO ARTURO	Régimen General
20948819253	BENITEZ CABAÑAS CESAR	Régimen General
20946610470	BOBEDA AYALA JORGE ARNALDO	Régimen General
20957690727	BOGADO ALCIDES	Régimen General
20950112647	BOGADO ANDRES	Régimen General
20956750114	BOGADO PABLO	Régimen General

p/ Prevención A.R.T. S.A.


C.P.N. Davi Guillermo
Gerente de Riesgo del Trabajo

DETALLE DEL PERSONAL AMPARADO AL 13/01/2020

Empresa: NORBAU S.A.. Contrato: 625862

C.U.I.L./Documento	APELLIDO Y NOMBRE	CONDICIÓN
20942659769	BOGADO SANGUINA MILCIADES RAMON	Régimen General
20947397614	BOGADO SANGUINA VICTOR HUGO	Régimen General
20949128599	CABALLERO JUAN CARLOS	Régimen General
20951059936	CABALLERO SEVERIANO	Régimen General
20944344242	CHAMORRO JULIO CESAR	Régimen General
20945503514	COLMAN MARIN CARLOS ALBERTO	Régimen General
23938739803	DELGADO IBARRA JUAN	Régimen General
20956255822	FARIÑA DUARTE SILVIO FLORENTIN	Régimen General
20950103702	FERREIRA ESPINOLA ARNULFO	Régimen General
23952578359	GAMARRA FERNANDEZ MIGUEL JAVIER	Régimen General
23957512399	GARAY DELVALLE MIGUEL	Régimen General
20943054100	GONZALEZ INSFRAN ROBERTO ISAAC	Régimen General
20944013076	INSFRAN MIRANDA LAUDENCIO	Régimen General
20497891559	LOPEZ DERLY RAMON	Régimen General
23948651009	LOPEZ GONZALEZ RODYS SAUL	Régimen General
20361601166	LOPEZ JOEL MATIAS	Régimen General
20427154107	LOPEZ SILVINO GUIDO	Régimen General
20950207206	MACIEL MARECO LUCIO	Régimen General
20945616882	MAIDANA ESPINOLA DERLIS ANTONIO	Régimen General
20951597725	MAIDANA EVER HUGO	Régimen General
20949752136	MARECO LUCENA JOEL DARIO	Régimen General
20957370706	MARTINEZ BARRIOS ALEXIS MIGUEL	Régimen General
20955851782	MARTINEZ HENRI MOISES	Régimen General
20953209625	MARTINEZ JUAN DANILO	Régimen General
20953903270	MARTINEZ VERA MARIO RAMON	Régimen General
20954304001	MENDIETA GONZALEZ VICTOR HUGO	Régimen General
20949793150	ORTIZ ROLON MIGUEL ANGEL	Régimen General
20956653984	PAREDES ALMADA JOSE MARIA	Régimen General
20945075733	PAREDES GAMARRA RICHAR ANIBAL	Régimen General
23946484539	PEREIRA VIEDMA ALBERTO ANDRES	Régimen General
20953640164	PRIETO VILLALBA EMILIO SEBASTIAN	Régimen General
20953759714	PRIETO VILLALBA JUAN CARLOS	Régimen General

p/ Prevención A.R.T. S.A.



C.P.N. Davi Guillermo
Gerente de Riesgo del Trabajo

DETALLE DEL PERSONAL AMPARADO AL 13/01/2020

Empresa: NORBAU S.A.. Contrato: 625862

C.U.I.L./Documento	APELLIDO Y NOMBRE	CONDICIÓN
20947031954	PRIETO VILLALBA LIDER RAMON	Régimen General
20930181154	ROJAS BENITEZ CATALINO	Régimen General
20954565603	ROMAN COLMAN FAVIO OSMAR	Régimen General
20946338037	ROMAN DELVALLE CARLOS OSMAR	Régimen General
20628408700	ROMAN DELVALLE FREDY	Régimen General
20947183940	ROMAN DELVALLE JUAN ANTONIO	Régimen General
20209271533	SALABERRY CARLOS ALBERTO	Régimen General
20141932811	SARLINGA OSCAR ALBERTO	Régimen General
20149961179	SIMONETTA JUAN CARLOS	Régimen General
23300144799	VERA RUBEN DARIO	Régimen General

TOTAL DE EMPLEADOS 59

p/ Prevención A.R.T. S.A.


C.P.N. Davi Guillermo
Gerente de Riesgo del Trabajo

ANEXO 6
INFORME DEL DESARROLLADOR

